

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	Owner	Deliverable	24 mag 10					31 mag 10			07 giu 10				
									V	D	M	G	S	L	M	V	D	M	G	S	
1	Progetto X	21 g?	lun 24/05/10	lun 21/06/10																	
2	Set up	13 g?	lun 24/05/10	mer 09/06/10																	
3	Strutturazione	5 g?	lun 24/05/10	ven 28/05/10																	
4	Definizione obiettivi e finalità del progetto	1 g?	lun 24/05/10	lun 24/05/10																	
5	Definizione WBS e macropiano	1 g?	mar 25/05/10	mar 25/05/10	4																
6	Definizione OBS di progetto	1 g?	mer 26/05/10	mer 26/05/10	5			Richiesta di approvvigionamento													
7	Identificazione di massima dei rischi	1 g?	gio 27/05/10	gio 27/05/10	6																
8	Definizione regole di governance e comunicazione	1 g?	ven 28/05/10	ven 28/05/10	7																
9	Pianificazione	8 g?	lun 31/05/10	mer 09/06/10	8																
10	Definizione del team di lavoro	1 g?	lun 31/05/10	lun 31/05/10																	
11	Pianificazione di dettaglio del progetto	1 g?	mar 01/06/10	mar 01/06/10	10			Piano operativo													
12	Definizione delle risorse e del budget di progetto	1 g?	mer 02/06/10	mer 02/06/10	11			Budget di progetto													
13	Pianificazione di dettaglio della gestione rischi	1 g?	gio 03/06/10	gio 03/06/10	12																
14	Redazione scheda servizio v. 1.0	1 g?	ven 04/06/10	ven 04/06/10	13			Scheda servizio V.1													
15	Redazione Project Charter	1 g?	lun 07/06/10	lun 07/06/10	14			Project charter V.0													
16	Approvazione scheda servizio v.1.0	1 g?	mar 08/06/10	mar 08/06/10	15																
17	Approvazione Project Charter V.0	1 g?	mer 09/06/10	mer 09/06/10	16																
18	Kick off meeting	0 g	mer 09/06/10	mer 09/06/10	17																
19	Analisi Requisiti e SLR	8 g?	gio 10/06/10	lun 21/06/10																	
20	Raccolta Requisiti	1 g?	gio 10/06/10	gio 10/06/10	17																
21	Raccolta Requisiti di business	1 g?	gio 10/06/10	gio 10/06/10																	
22	Raccolta Requisiti di erogabilità (compreso reporting e monitoraggio)	1 g?	gio 10/06/10	gio 10/06/10																	
23	Raccolta Requisiti tecnici	1 g?	gio 10/06/10	gio 10/06/10																	
24	Analisi Requisiti	1 g?	ven 11/06/10	ven 11/06/10	21;22;23																
25	Redazione Outline Requirements	1 g?	lun 14/06/10	lun 14/06/10	24																
26	Approvazione outline requirements	1 g?	mar 15/06/10	mar 15/06/10	25			Outline requirements													
27	Pianificazione e progettazione di formazione e comunicazione	1 g	mer 16/06/10	mer 16/06/10	26			Piano comunicazione e formazione V.0													
28	Aggiornamento Project Charter e Scheda di servizio	1 g?	gio 17/06/10	gio 17/06/10	27			Project Charter, Scheda servizio													
29	Elaborazione strategia di collaudo	1 g?	ven 18/06/10	ven 18/06/10	28		Resp.le dei collaudi														
30	Approvazione strategia di collaudo	1 g?	lun 21/06/10	lun 21/06/10	29			Strategia di collaudo													
31	SAL CHIUSURA FASE DI ANALISI	1 g?	mar 22/06/10	mar 22/06/10	30			Piano operativo avanzato e pubblicato													
32	Progettazione concettuale	8 g?	mer 23/06/10	ven 02/07/10																	
33	Modello architetturale	2 g?	mer 23/06/10	gio 24/06/10																	
34	Progettazione architetturale	1 g	mer 23/06/10	mer 23/06/10	31																
35	Progettazione SLA/OLA	1 g?	gio 24/06/10	gio 24/06/10	34																
36	Progettazione concettuale dei componenti	1 g?	ven 25/06/10	ven 25/06/10																	
37	Progettazione algoritmi	1 g?	ven 25/06/10	ven 25/06/10	35																
38	Progettazione logica dei dati	1 g?	ven 25/06/10	ven 25/06/10	35																
39	Progettazione delle interfacce	1 g?	ven 25/06/10	ven 25/06/10	35																
40	Progettazione del modello di erogazione	1 g?	ven 25/06/10	ven 25/06/10	35																
41	Progettazione altri elementi non funzionali	1 g?	ven 25/06/10	ven 25/06/10	35																
42	Relazione fra requisiti, SLR e progettazione	1 g?	lun 28/06/10	lun 28/06/10	41																
43	Redazione outline di progettazione	1 g?	mar 29/06/10	mar 29/06/10	42			Outline di progettazione													
44	Approvazione outline di progettazione	1 g?	mer 30/06/10	mer 30/06/10	43																
45	Redazione Piano di collaudo V.0	1 g?	gio 01/07/10	gio 01/07/10	44		Resp.le dei collaudi	Piano di collaudo V.0													
46	Redazione Strategia di RollOut	1 g?	gio 01/07/10	gio 01/07/10	44			Strategia di RollOut (Acceptance test)													
47	Approvazione Piano di collaudo V.0 e strategia di rollout	1 g?	ven 02/07/10	ven 02/07/10	45;46																
48	SAL CHIUSURA FASE DI PROGETTAZIONE CONCETTUALE	1 g?	lun 05/07/10	lun 05/07/10	47																
49	Progettazione di dettaglio	40 g?	lun 24/05/10	ven 16/07/10																	
50	Definizione di dettaglio dell'architettura	1 g?	mar 06/07/10	mar 06/07/10																	
51	Dettaglio architettura tecnologica e applicativa	1 g?	mar 06/07/10	mar 06/07/10	48																
52	Definizione dei moduli/componenti funzionali e non funzionali	1 g?	mar 06/07/10	mar 06/07/10	48																
53	Definizione di dettaglio dei componenti	33 g?	lun 24/05/10	mer 07/07/10																	
54	Definizione strutture fisiche dei dati	1 g?	mer 07/07/10	mer 07/07/10	51;52																
55	Definizione algoritmi dei singoli moduli	1 g?	mer 07/07/10	mer 07/07/10	51;52																
56	Definizione delle interfacce utente, interne ed esterne	1 g?	mer 07/07/10	mer 07/07/10	51;52																

Progetto: Template_Gantt_V0.1
Data: ven 01/07/22

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza

<

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	Owner	Deliverable	24 mag 10					31 mag 10			07 giu 10			
									V	D	M	G	S	L	M	V	D	M	G	S
57	Definizione di dettaglio sottosistemi non funzionali e modello di erogazione	1 g?	mer 07/07/10	mer 07/07/10	51;52															
58	Progettazione e pianificazione di dettaglio della formazione	1 g?	mer 07/07/10	mer 07/07/10	51;52			Piano comunicazione e formazione definit												
59	Definizione del sistema di reporting e monitoraggio	1 g?	lun 24/05/10	lun 24/05/10																
60	Relazione fra requisiti, SLA e progettazione di dettaglio	1 g?	gio 08/07/10	gio 08/07/10	54;55;56;57;58															
61	Redazione outline analisi di dettaglio	1 g?	ven 09/07/10	ven 09/07/10	60			Outline analisi di dettaglio												
62	Approvazione analisi di dettaglio	1 g?	lun 12/07/10	lun 12/07/10	61															
63	Pianificazione dei test (collaudo interno)	1 g?	mar 13/07/10	mar 13/07/10	62															
64	Redazione piano dei test	1 g?	mer 14/07/10	mer 14/07/10	63			Piano dei test e report												
65	Redazione Piano di collaudo definitivo	1 g?	gio 15/07/10	gio 15/07/10	64		Resp.le dei collaudi	Piano di collaudo definitivo												
66	Approvazione piano dei test e piano di collaudo definitivo	1 g?	ven 16/07/10	ven 16/07/10	65															
67	SAL CHIUSURA FASE DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO	1 g?	lun 19/07/10	lun 19/07/10	66															
68	Sviluppo, test e manualistica	5 g?	mar 20/07/10	lun 26/07/10																
69	Codifica e test	5 g?	mar 20/07/10	lun 26/07/10																
70	Codifica e documentazione dei componenti	1 g?	mar 20/07/10	mar 20/07/10	67															
71	Progettazione di dettaglio dei test	1 g?	mer 21/07/10	mer 21/07/10	70			Piano dei test e report												
72	Esecuzione dei test	1 g?	gio 22/07/10	gio 22/07/10	71															
73	Redazione della documentazione dei test eseguiti (report)	1 g?	ven 23/07/10	ven 23/07/10	72			Piano dei test e report												
74	Aggiornamento del Project Charter	1 g?	lun 26/07/10	lun 26/07/10	73			Project Charter												
75	Manuali e procedure	2 g?	gio 22/07/10	ven 23/07/10																
76	Redazione del manuale utente	1 g?	gio 22/07/10	gio 22/07/10	71			Manuale utente												
77	Approvazione del manuale utente	1 g?	ven 23/07/10	ven 23/07/10	76															
78	Redazione manuali di esercizio e installazione	1 g?	gio 22/07/10	gio 22/07/10	71			Manuali di esercizio e installazione												
79	Approvazione dei manuali di esercizio e installazione	1 g?	ven 23/07/10	ven 23/07/10	78															
80	Redazione della procedura operativa	1 g?	gio 22/07/10	gio 22/07/10	71			Procedura operativa												
81	Approvazione della procedura operativa	1 g?	ven 23/07/10	ven 23/07/10	80															
82	Definizione specifiche di customer service e knowledge base	1 g?	gio 22/07/10	gio 22/07/10	71			Specifiche customer service e KB												
83	Approvazione specifiche customer service, KB e ticket assistenza	1 g?	ven 23/07/10	ven 23/07/10	82															
84	Formazione	2 g?	gio 22/07/10	ven 23/07/10																
85	Erogazione della formazione	1 g?	gio 22/07/10	gio 22/07/10	71															
86	Report formazione erogata	1 g?	ven 23/07/10	ven 23/07/10	85															
87	SAL CHIUSURA FASE DI SVILUPPO, TEST E MANUALISTICA	1 g?	mar 27/07/10	mar 27/07/10	74;77;79;81;82															
88	Collaudo	5 g?	mer 28/07/10	mar 03/08/10																
89	Esecuzione del collaudo integrato funzionale	1 g?	mer 28/07/10	mer 28/07/10	87		Resp.le dei collaudi													
90	Esecuzione dei collaudi non funzionali	1 g?	mer 28/07/10	mer 28/07/10	87															
91	Redazione report collaudi	1 g?	gio 29/07/10	gio 29/07/10	90		Resp.le dei collaudi	Report collaudi												
92	Valutazione esiti collaudi rispetto a requisiti funzionali, SLR e requisiti di erogabilità	1 g?	ven 30/07/10	ven 30/07/10	91															
93	Redazione e approvazione del Verbale di collaudo	1 g?	lun 02/08/10	lun 02/08/10	92			Verbale di collaudo												
94	Aggiornamento del Project Charter	1 g?	mar 03/08/10	mar 03/08/10	93			Project Charter												
95	SAL CHIUSURA FASE DI COLLAUDO	1 g?	mer 04/08/10	mer 04/08/10	94															
96	RollOut e chiusura progetto	12 g?	gio 05/08/10	ven 20/08/10																
97	Roll-Out	4 g?	gio 05/08/10	mar 10/08/10																
98	Predisposizione ambiente per il rollout	1 g?	gio 05/08/10	gio 05/08/10	95															
99	Installazione ed esercizio pilota	1 g?	ven 06/08/10	ven 06/08/10	98															
100	Avviamento esercizio	1 g?	lun 09/08/10	lun 09/08/10	99			Contenuti della comunicazione												
101	Redazione e approvazione acceptance test	1 g?	mar 10/08/10	mar 10/08/10	100			Acceptance test												
102	Erogazione eventuale follow-up training	1 g?	mer 11/08/10	mer 11/08/10	101															
103	Chiusura del progetto	7 g?	gio 12/08/10	ven 20/08/10																
104	Redazione scheda servizio definitiva	1 g?	gio 12/08/10	gio 12/08/10	102			Scheda servizio definitiva												
105	Aggiornamento e chiusura project charter	1 g?	ven 13/08/10	ven 13/08/10	104			Project Charter												
106	Rilascio e deposito documentazione di progetto e di servizio	1 g?	lun 16/08/10	lun 16/08/10	105;104			+Tutti i manuali e la procedura operativa												
107	Aggiornamento della mappa processi aziendali	1 g?	mar 17/08/10	mar 17/08/10	106															
108	Definizione contratti e listini del servizio	1 g?	mer 18/08/10	mer 18/08/10	107															
109	Definizione modalità e adeguamento fatturazione	1 g?	gio 19/08/10	gio 19/08/10	108															
110	Redazione e approvazione del Verbale di chiusura progetto	1 g?	ven 20/08/10	ven 20/08/10	107;108;109			Verbale di chiusura progetto												
111	SAL CHIUSURA PROGETTO	1 g?	lun 23/08/10	lun 23/08/10	110															

Progetto: Template_Gantt_V0.1

Data: ven 01/07/22

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	Owner	Deliverable	24 mag 10					31 mag 10			07 giu 10			
									V	D	M	G	S	L	M	V	D	M	G	S
112	 Chiusura progetto	1 g?	mar 24/08/10	mar 24/08/10	111															
113																				
114																				
115	 Avanzamento periodico di progetto	61 g	lun 24/05/10	lun 16/08/10																
116	 SAL periodico 1	1 g	lun 24/05/10	lun 24/05/10																
117	 SAL periodico 2	1 g	lun 07/06/10	lun 07/06/10																
118	 SAL periodico 3	1 g	lun 21/06/10	lun 21/06/10																
119	 SAL periodico 4	1 g	lun 05/07/10	lun 05/07/10																
120	 SAL periodico 5	1 g	lun 19/07/10	lun 19/07/10																
121	 SAL periodico 6	1 g	lun 02/08/10	lun 02/08/10																
122	 SAL periodico 7	1 g	lun 16/08/10	lun 16/08/10																


Progetto: Template_Gantt_V0.1
Data: ven 01/07/22


Attività


Divisione


Cardine

Riepilogo











Riepilogo progetto


Attività esterne


Cardine esterno

Attività inattiva











Cardine inattiva


Riepilogo inattiva


Attività manuale

Solo-durata











Riporto riepilogo manuale


Riepilogo manuale


Solo inizio

Solo-fine












Avanzamento


Scadenza





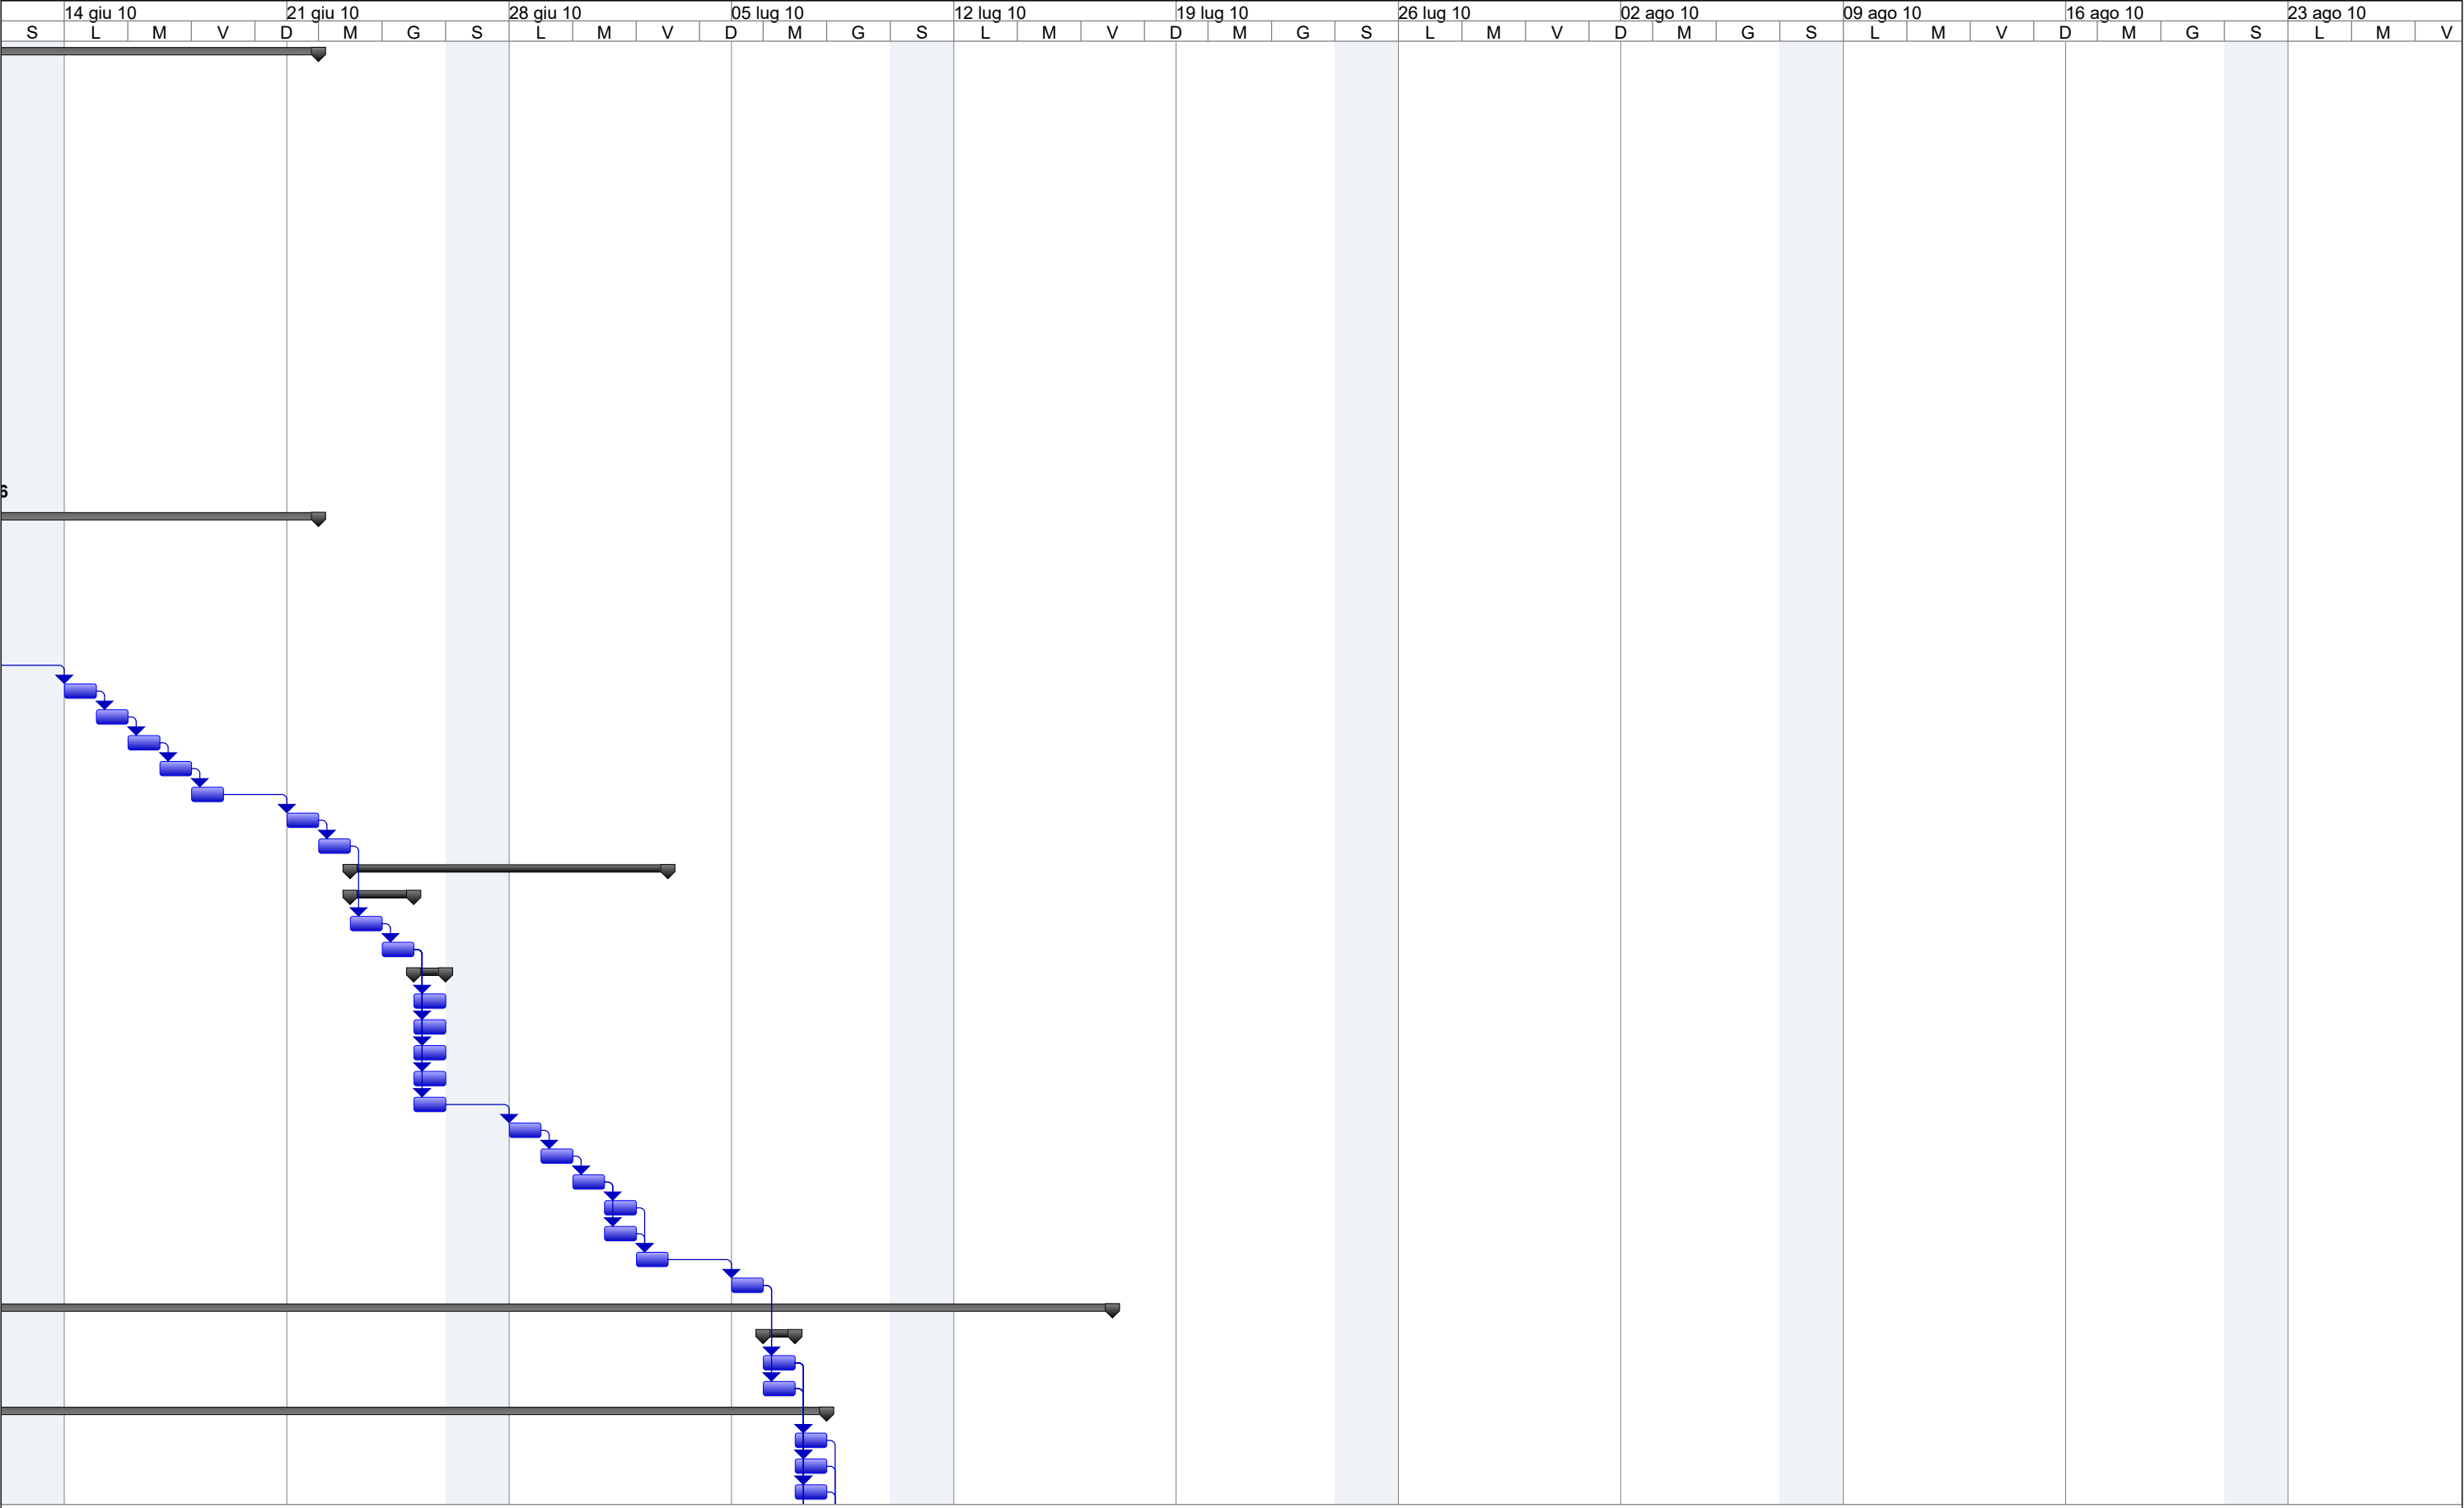

Progetto: Template_Gantt_V0.1 Data: ven 01/07/22	Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
	Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Scadenza	
	Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
	Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			

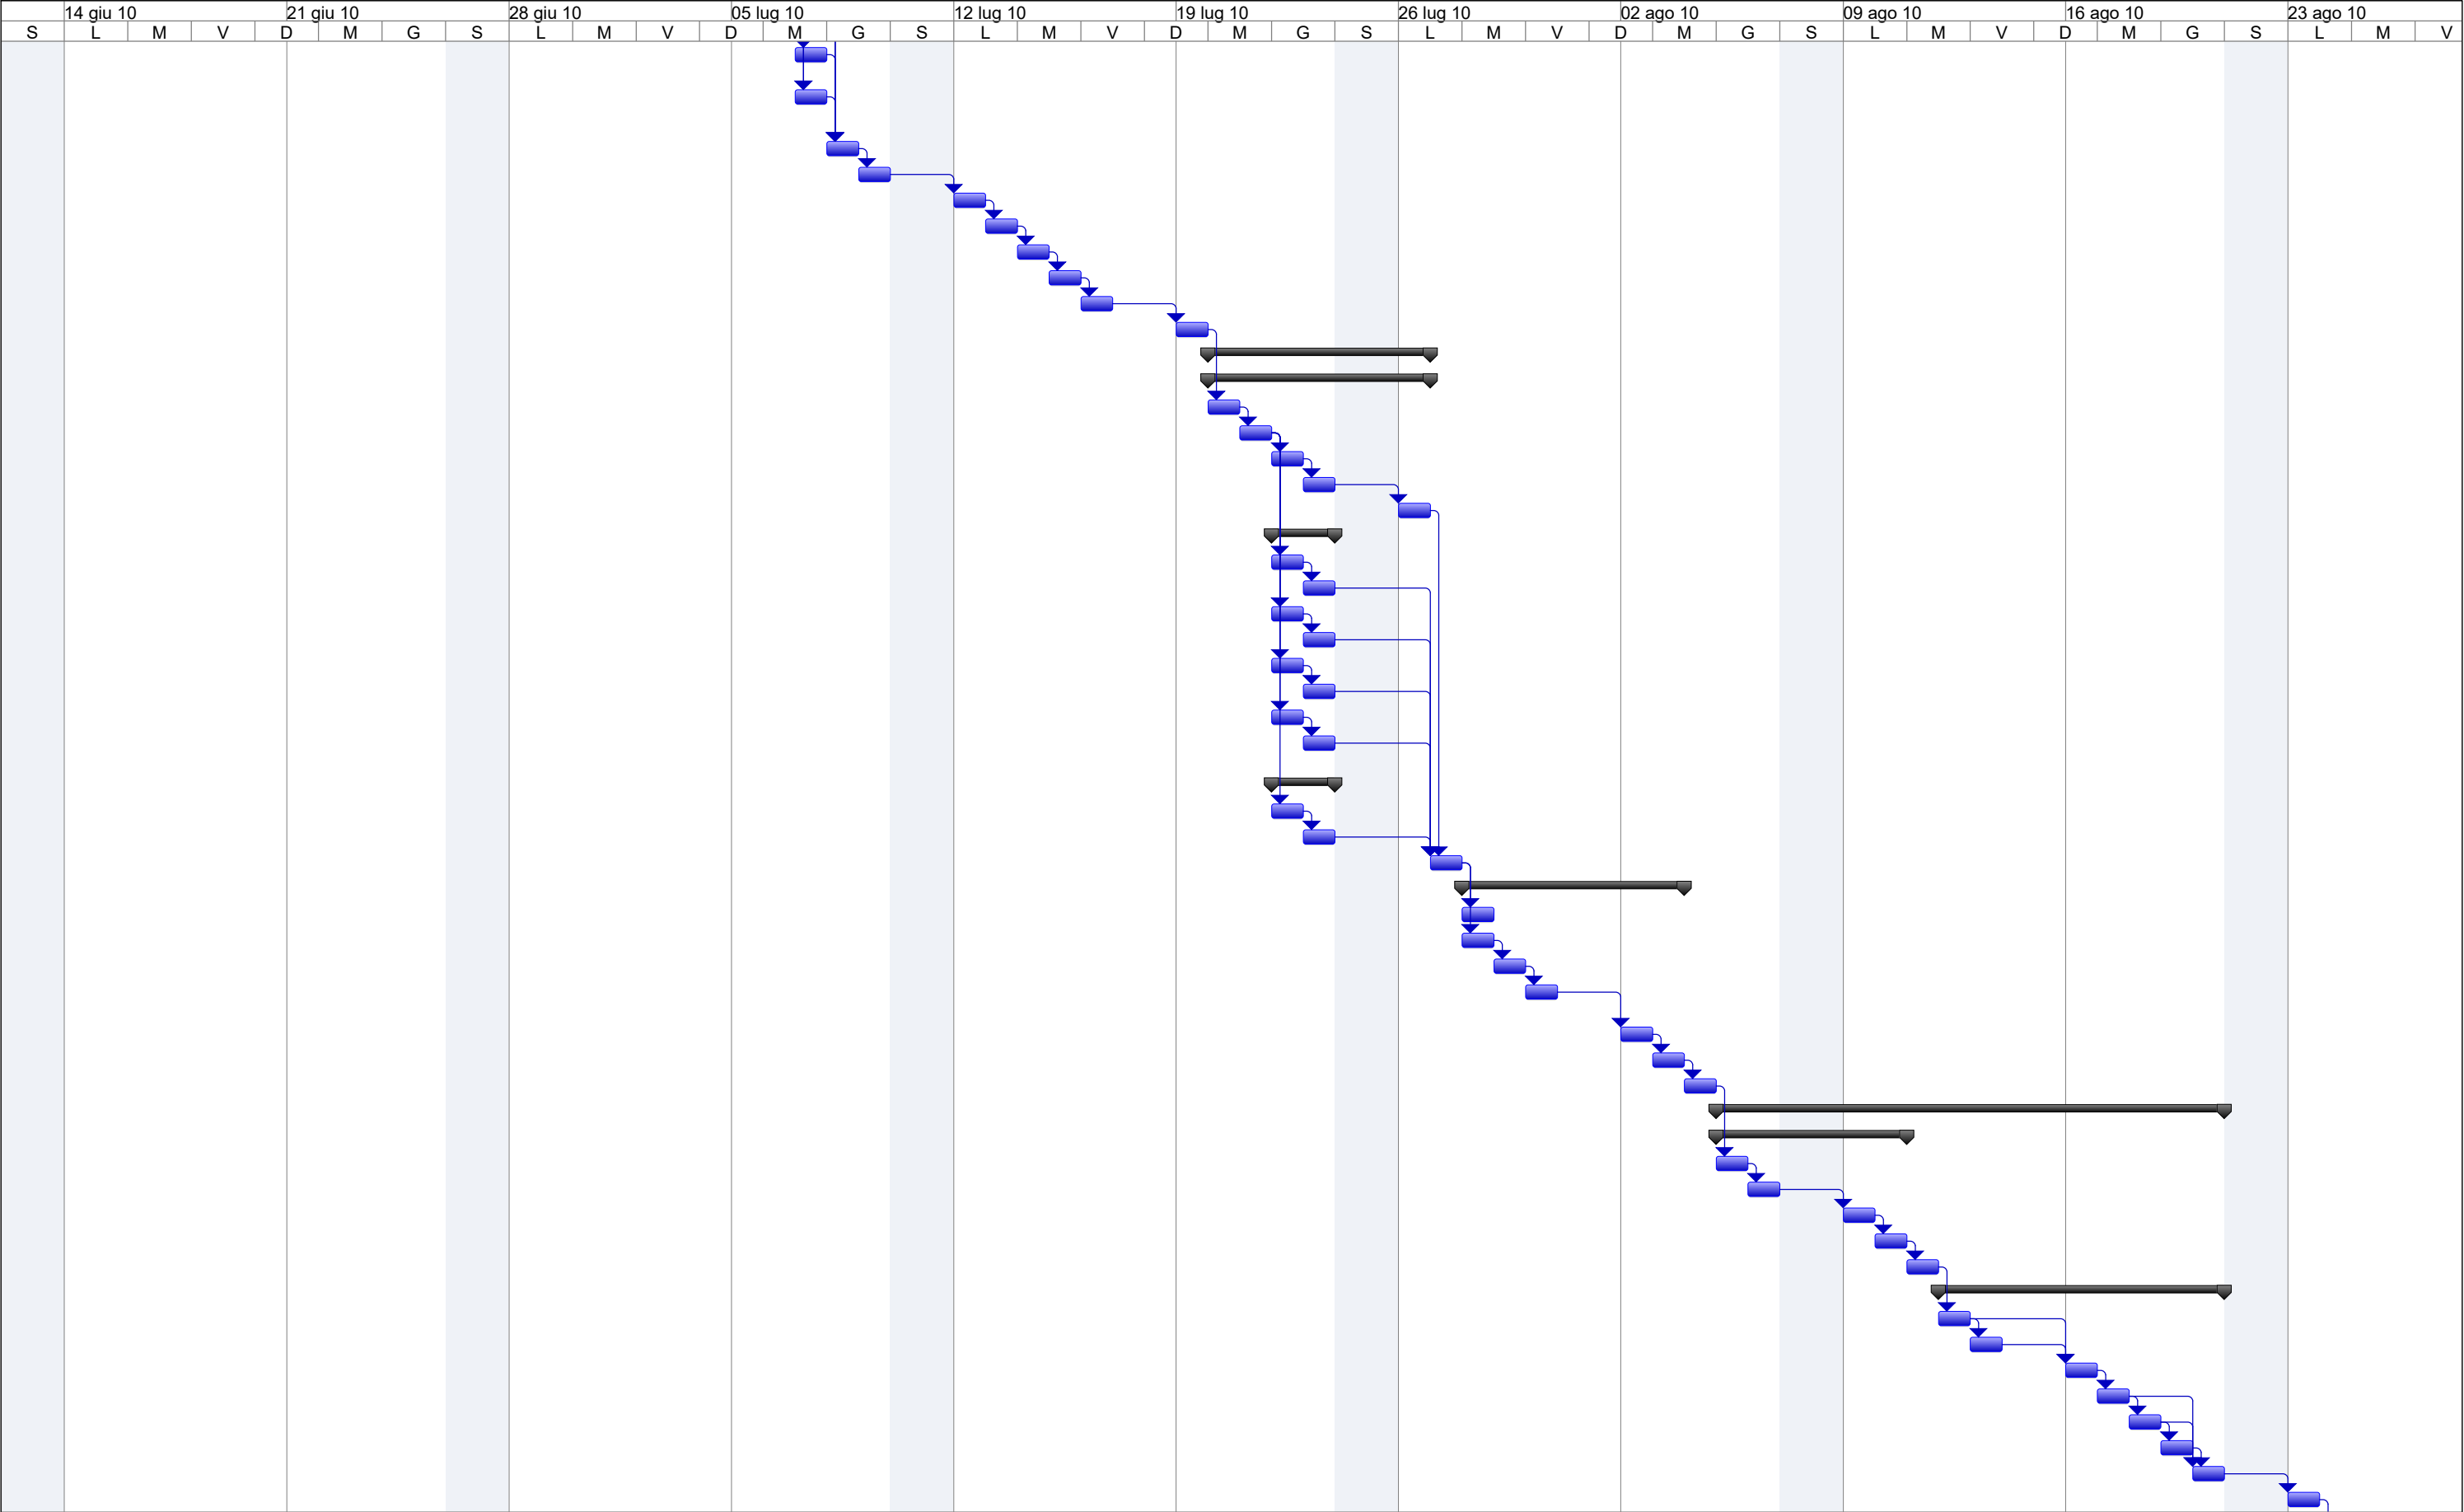

Progetto: Template_Gantt_V0.1
Data: ven 01/07/22

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza



Progetto: Template_Gantt_V0.1
Data: ven 01/07/22

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale


Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Avanzamento

Scadenza



30 ago 10					06 set 10				13 set 10				20 set 10				27 set 10				04 ott 10				11 ott 10				18 ott 10				25 ott 10				01 nov 10				08 nov 10			
V	D	M	G	S	L	M	V	D	M	G	S	L	M	V	D	M	G	S	L	M	V	D	M	G	S	L	M	V	D	M	G	S	L	M	V	D	M	G						



Progetto: Template_Gantt_V0.1 Data: ven 01/07/22	Attività		Riepilogo progetto		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
	Divisione		Attività esterne		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Scadenza	
	Cardine		Cardine esterno		Attività manuale		Solo inizio			
	Riepilogo		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine			
